

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E****ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO****MI-SIG-SIG-FT-01 V4****NOMBRE DE LA REUNIÓN:** VISITA OBRA CONVENIO 1186 DEL 2017 "DOTACIÓN Y TERMINACIÓN II TORRE USS MEISSEN SUBRED SUR.**RESPONSABLE:** Dra. Mónica Salguero, Líder proyectos **SECRETARIO:** Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar USS Meissen.**REUNIÓN N°:** **FECHA:** Septiembre 17 de 2021 **HORA INICIO:** 9:30 a.m.**LUGAR:** Visita Obra II Torre USS Meissen **HORA FINAL:** 11:30 a.m**1. OBJETIVO:**

REALIZAR VISITA OBRA CON VEEDORES CONVENIO 1186 DEL 2017 "DOTACIÓN Y TERMINACIÓN II TORRES USS MEISSEN".

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2	Como evidencia de asistencia a la reunión, se anexan registro fotográfico de la reunión.				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.
2. lectura del acta anterior
3. Visita y socialización de avances del convenio dotación y terminación II Torres USS Meissen convenio 1186 del 2017- subred sur. Arquitecta Ana Castillo
4. Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- (4) Veedores (Ubalina Huertas, Agustín Moreno, Jeremías Ramírez, Ana de Dios González y Javier, Jacqueline pico, Epifanio Gutiérrez
- Dra. Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Sur.
- Arquitecta Ana Castillo de la Subred Sur
- Dra. Rosa Tulía Quintero. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno


6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Se da un saludo y presentación del objetivo de la reunión por parte de la profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Dra. Rosa Tulia Quintero, quien da a conocer el objetivo de la reunión, el cual es realizar visita a la obra y conocer los avances a la fecha del Convenio 1186 del 2017 "Dotación y Terminación II Torres USS Meissen Subred Sur".

2. Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

3. Inicialmente se realiza Socialización de avances del Proyecto del proyecto Dotación y Terminación II Torres USS Meissen convenio 1186 del 2017- subred sur y luego se realiza recorrido por la obra.

Socialización del cronograma de ejecución del proyecto

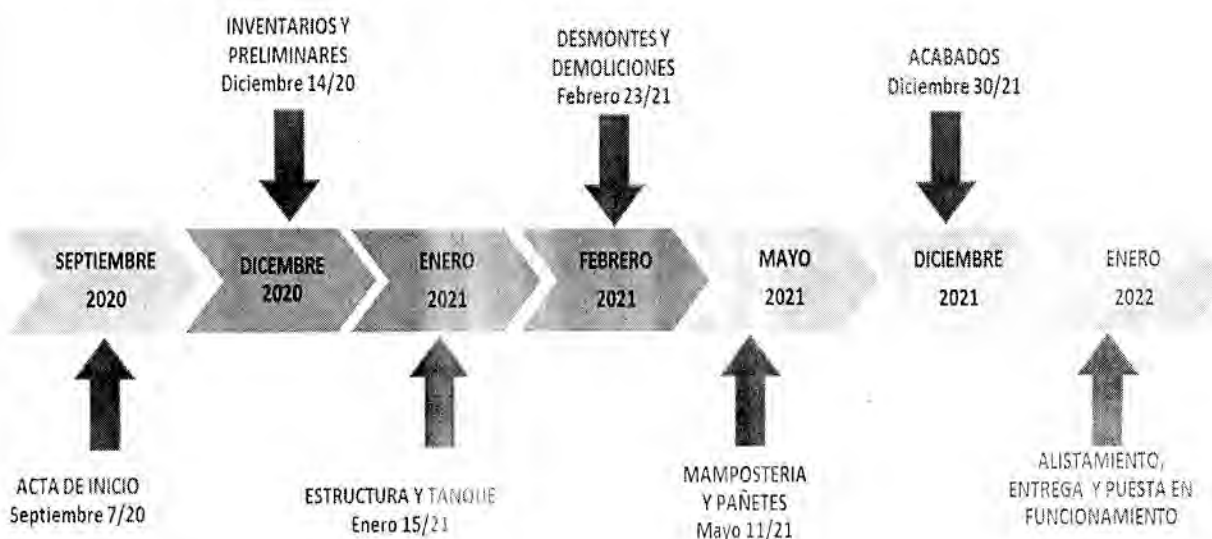

HITO	DIFICULTADES	AVANCES
MAMPOSTERIA Y ACABADOS	El contratista continúa presentado dificultades con la vinculación de personal a la obra.	Se continúa con la ejecución de las obras, y se solicitó al contratista el incremento de personal y se encuentran implementando el plan de contingencia.

c. Se socializa las principales actividades desarrolladas y en trámite:

% avance obra, Ejecutado: 57% Programado: 59% - Diferencia: 2%

La arquitecta Ana Castillo, socializa Las actividades en ejecución en obra, hace un video en vivo y en directo en el cual fue mostrando los avances de cada uno de los pisos de la infraestructura de la obra así:

- Sótano: Mampostería, pañetes, estuco plástico y pintura, instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas. Instalación de piso vibro prensado.
- Piso 1: Pañetes y estuco plástico, Instalación de piso vibro prensado, Instalación canalizaciones Voz y Datos.
- Piso 2: Mampostería Ductos, Remates Pañetes en Mampostería Muros divisorios y estación de enfermería, Instalación canalizaciones Mampostería, pañetes, estuco plástico y pintura, Instalaciones Hidráulicas, eléctricas y ductos HVAC, mediacaña,
- Piso 3: Mampostería, pañetes, estuco plástico y pintura, Instalaciones eléctricas y Voz y Datos, Soportaria y Armado de Ductos HVAC y Gabinetes RCI, instalación tubería eléctrica Hidrosanitarias, Instalación tableta Vibro prensada.
- Piso 4: Instalaciones eléctricas y de Voz y Datos, Regatas e instalación tubería eléctrica, Instalación soportaria, Armado de Ductos HVAC e Instalación Tuberías Hidrosanitarias, Pañetes y estuco plástico, enchape de muros y pisos en baños y cuartos de servicios complementarios.
- Piso 5: Montaje tubería Hidrosanitarias, Regatas eléctricas, enchapes de muros y pisos en baños y cuartos de servicios complementarios, fundida Mediacañas y boca puertas, Instalaciones Ductos HVAC, Montaje Gabinetes Fachada RCI.
- Piso 6: Instalación de tubería del Sistema detección RCI, Hidrosanitaria, registros y válvulas de control, Pañetes y estuco plástico, mediacañas, enchape piso duchas y enchapes muros y cuartos complementarios, Montaje Gabinetes Fachada RCI, Estructura cielorrasos.

En cuanto al Componente De Dotación, la Dra. Mónica Salguero explica los siguientes avances:

- Aprobación en Comité Operativo del Convenio, de los estudios previos y pliego de condiciones para la adquisición de la dotación biomédica y mobiliario
 - Inicio de etapa precontractual, mediante publicación en la plataforma SECOP II el 22 de junio de 2021, con número de proceso ISI 005 DE 2021. Objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRÁN Y LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E".
 - El 16 de julio se lleva a cabo el cierre del proceso, recibiendo 47 ofertas, las cuales EGAT se encuentra evaluando.
- La adquisición de dotación de equipos de sistemas, está a cargo de la SDS y lo realizara por Bolsa Mercantil y se entregarán a la Subred mediante convenio, en comodato.

Se socializa ejecución financiera proyecto a la fecha:

Componentes del convenio interadministrativo No.	Valor Compromiso Contratado	Valor Físico Ejecutado Pagado	Porcentaje de ejecución Financiera
Consultoría y/o Estudios	\$737.800.000	\$737.800.000	100%
Interventoría de Consultoría y/o Estudios	\$109.681.429	\$109.681.429	100%
Obra	\$20.337.841.109	\$1.233.750.272	54%
Interventoría	\$2.038.832.569	\$ 822.046.277	54%
Dotación	-	-	-
TOTAL	\$23.224.155.107	\$2.903.277.978	51,33%

Finamente se muestran algunas imágenes de los avances de la obra:



7. Cierre. Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión..

Se anexan fotos de evidencia de la reunión. de manera virtual, ya que no se pueden recoger firmas. Se concertó con los veedores que las firmas se recogerán en el momento que se pueda volver a realizar reuniones presenciales, de igual forma manifiestan no realizar diligenciamiento del formato de seguimiento a actividades; esta actividad la retomarán cuando se vuelvan a realizar reuniones presenciales, por el momento se cuenta con las actas de reuniones donde reposa la información de los avances del convenio.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
2002

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

7. COMPROMISOS:




QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Realizar visita a la obra con los veedores II Torre USS Meissen	Recorrido a la obra	Octubre de 2021	Dra. Mónica Salguero

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN













SECRETARIO REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero P.

	ACTA VISITA DE OBRA	
	 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

Nombre Acta:	Fecha: Sep 17 de 2021	Lugar: Torre 2 USS Meissen	Hora: 9:15am
Lider: Subred Sur - Desarrollo Institucional		Inicio: 9:15am	Fin:
Tipo: Grupo Primario <input type="checkbox"/> Comité Obra <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/>	Nombre Comité, Reunión y Otro: Reunión y Recorrido Obra		
OBJETIVO: Reunión y Recorrido Obra Grupo de Veedores Torre II			

ASISTENCIA

	Nombre	Entidad	Firma
1	Epifanio Gutiérrez	VEEDORIA	
2	JAVIER ROBERTO JIMENEZ C.	VEEDORIA	
3	Jeremías Ramírez	veedores	
4	JUSTIN MORALES M	veedor	
5	Juan Rincon	Urip	
6	Stefkeline paco M	veedor	
7	Rubén Celis Ariza	subred sur	
8	UBALDINO HUERTAS RAMÍREZ	VEEDOR	
9	Jorge Castellanos	Subred Sur E.S.E	
10	Rosa T. Quintana	Subred Sur	
11	Ricardo Madinez G	Subred Sur	
12	Ana Belkis Gonzalez Caro	veedoria subred	Ana Gonzalez C.
13	Monica Salgado	subred sur	
14	Ana Gonzalez Castillo	Subred Sur	Ana Gonzalez
15			
